

**Alocação de Água -
10/08/2017 - Pombal - PB.**

ANA – Coordenação de Marcos
Regulatórios e Alocação de
Água – (61) 2109-5566

Comissão de Acompanhamento
da Alocação:

José Messias Filho - AESA / PB
(83) 99105-8357

José Erismar Gomes de Oliveira
CAGEPA / PB - (83) 99926-
3327

Everaldo Moura - DNOCS - (83)
99829-8058

Rogério Junqueira - DPIVAS -
(83)99600-0431

Josafá da Silva - Comunidade
Sítio Mãe D'Água - (83) 99830-
1660 / 99802-9631

José Neto - Município de
Coremas - (83) 99623-4202


Maria Araújo Município de
Pombal / PB - (84) 99900-6235

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

Outubro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Curema

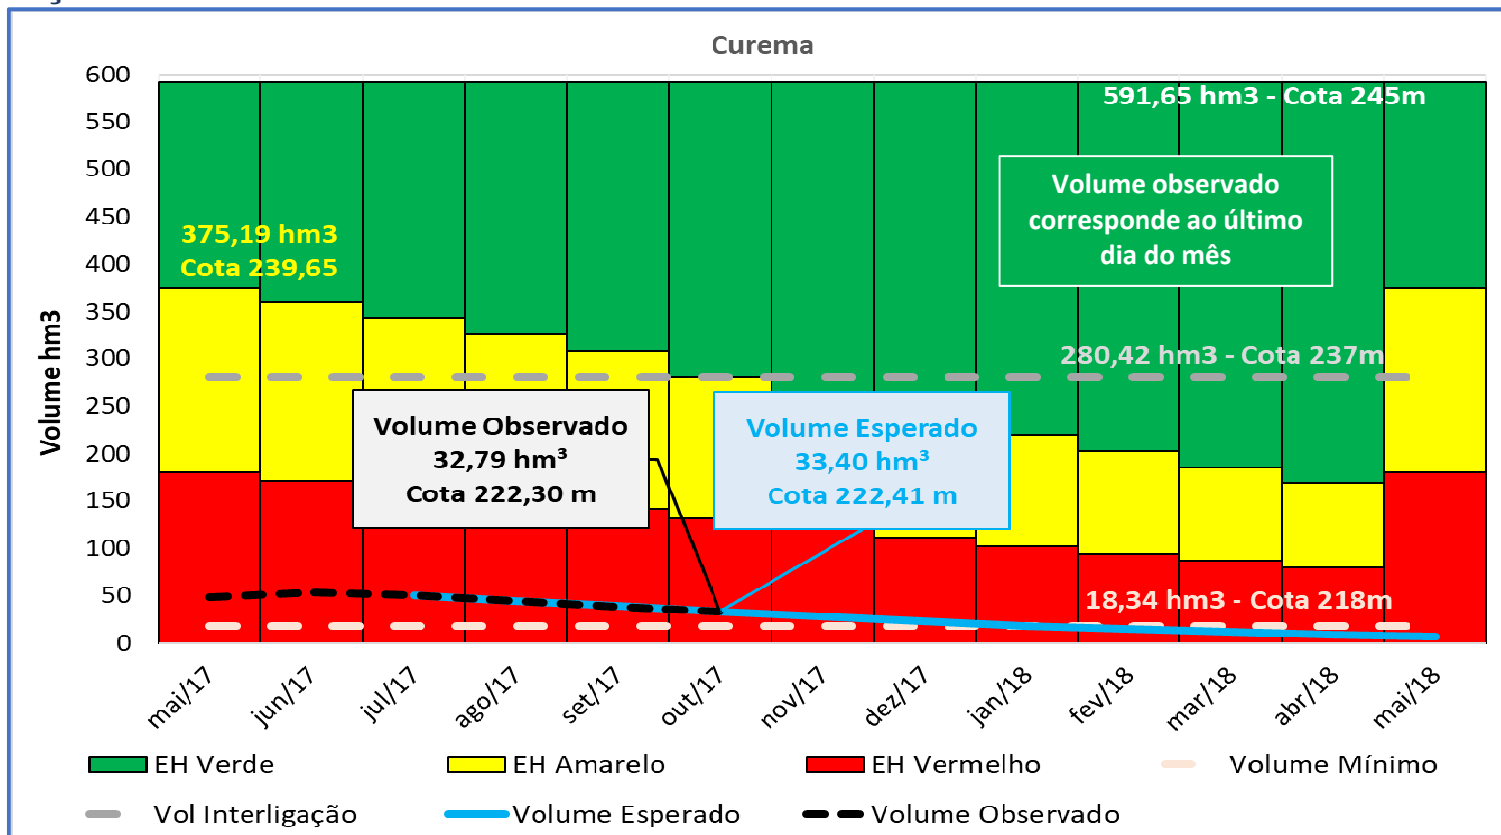

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jun/17	53,57	53,57	out/17	33,40	32,79	fev/18	15,35	
jul/17	49,87	49,87	nov/17	28,26		mar/18	12,32	
ago/17	44,17	44,72	dez/17	23,18		abr/18	9,45	
set/17	38,93	37,82	jan/18	18,52		mai/18	6,50	

Alocação de Água -
10/08/2017 - Pombal - PB.

Comissão de Acompanhamento
da Alocação (continuação):

Josué de Araújo - Município de
São Bento / PB - (83) 99954-0409

Gorete César da Silva -
Assentamento Imaculada - (83)
98180 - 8778


O Termo de Alocação e os
Boletins de
Acompanhamento estão
disponíveis em
www.ana.gov.br em
ACESSO RÁPIDO >>
Alocação de Água.

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES CUREMA E MÃE D'ÁGUA

Outubro/2017

Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Açude Mãe D'Água

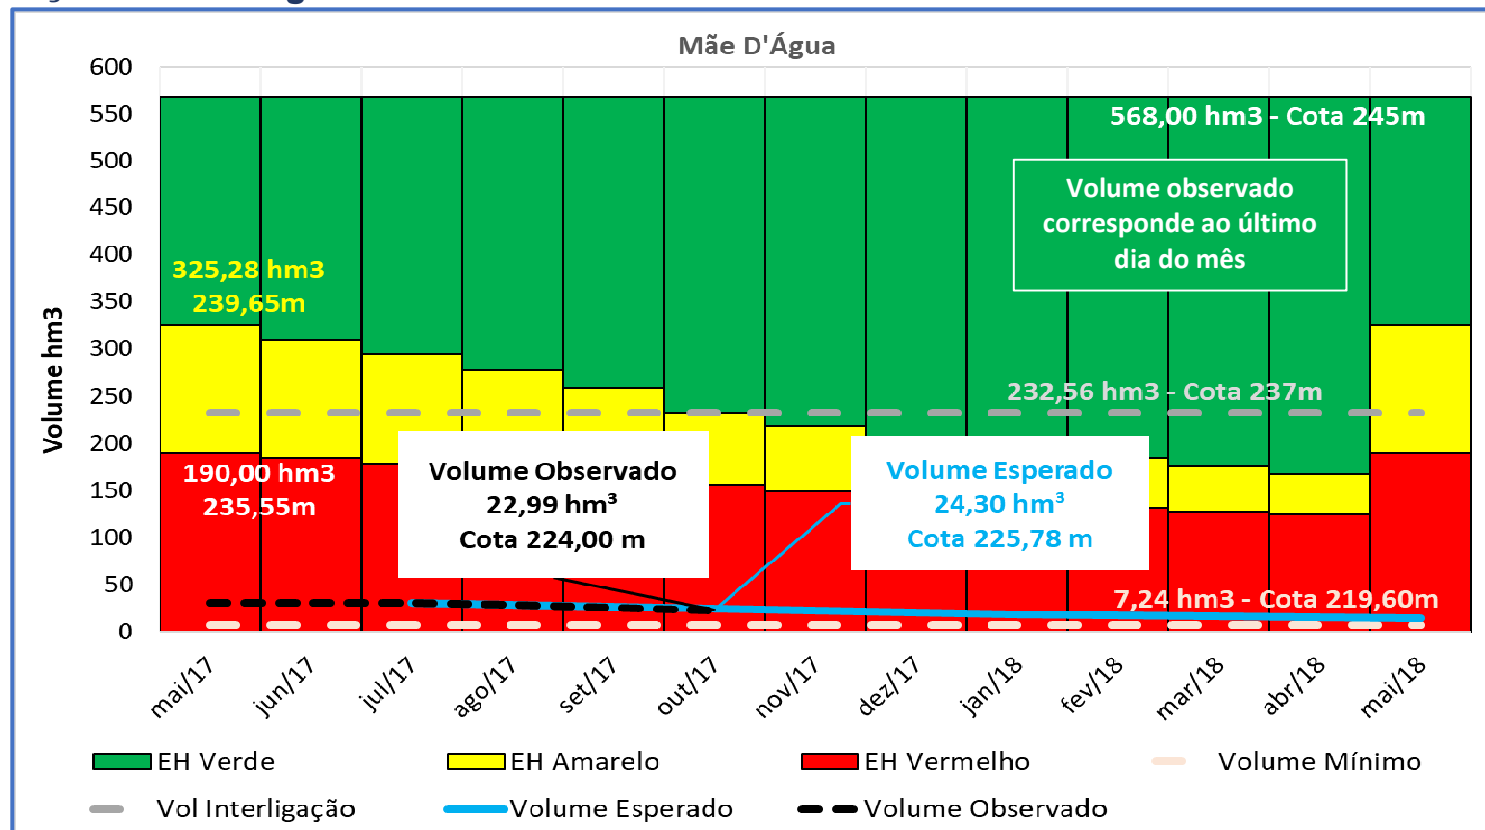

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
jun/17	31,14	31,14	out/17	24,30	22,99	fev/18	17,63	
jul/17	30,60	30,60	nov/17	22,33		mar/18	16,48	
ago/17	28,50	28,66	dez/17	20,48		abr/18	15,40	
set/17	26,43	25,67	jan/18	18,91		mai/18	14,27	

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

Outubro/2017

Usos Esperados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
CAGEPA - Abastecimento público	NA	NA											
CAERN - Abastecimento público	NA	NA											
Demais Usos (Irrigação e Indústria)	NA	NA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Perenização jusante (inclui perdas e usos de pouca expressão)	NA	NA											
Total	NA	NA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **ACESSO RÁPIDO >> Alocação de Água**

Usos Observados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
CAGEPA - Abastecimento público	NA	NA	495	402	449								449
CAERN - Abastecimento público	NA	NA	0	0	0								0
Demais Usos (Irrigação e Indústria)	NA	NA	0	0	0								0
Perenização jusante (inclui perdas e usos de pouca expressão)	NA	NA	1005	1098	956								1020
Total	NA	NA	1500	1500	1395								1465

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES CUREMA E MÃE D'ÁGUA

Outubro/2017

Usos Esperados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Canal da Redenção	NA	NA	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Demais usos	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rio Aguiar	NA	NA	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Total	NA	NA	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260

Usos Observados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Canal da Redenção	NA	NA	SI	SI	150								150
Demais usos	NA	NA	SI	SI	SI								SI
Rio Aguiar	NA	NA	77	158	451								229
Total	NA	NA	77	158	601								279

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

1 - A vazão defluente do reservatório Mãe D'Água para o rio Aguiar foi alterada em 25/09 para 500 l/s, atendendo solicitação EMERGENCIAL da Comissão de Acompanhamento, por meio do Ofício nº 037/2017-DC do CBH Piancó- Piranhas-Açu.

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em www.ana.gov.br em **ACESSO RÁPIDO >> Alocação de Água.**

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição de cotas dos açudes Curema e Mãe D'Água	DNOCS	Semanal		
1.2	Medição e ajuste da descarga dos reservatórios Curema e Mãe D'Água	ANA (PROJECTE) e DNOCS	Mensal		
1.3	Medição de volumes capados para abastecimento público no reservatório e nos rios Piranhas e Piancó	CAGEPA	Mensal		
1.4	Medição de volumes captados para abastecimento público no rio Piranhas	CAERN	Mensal	Suspensa na estiagem	
1.5	Atualização da curva - chave do Canal da Redenção e medição dos volumes captados	AESA	Mensal		
1.6	Estimativa da vazão captada pelo consumo de energia elétrica	ANA	Anual		
2	Instrumentação				
2.1	Instalação e funcionamento contínuo de medidores de vazão e volume nas captações	CAGEPA e CAERN	2017		
2.2	Instalação de régua linimétricas nos açudes com a verificação da correlação com a régua anterior	ANA	2017		
2.3	Batimetria dos Açudes Curema e Mãe D'Água	ANA	2017		
3	Regulação de usos				
3.1	Estudo e proposta de Marco Regulatório para os açudes e trecho perenizado	ANA, AESA e IGARN	2017		



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2017-2018 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

Outubro/2017

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
3.2	Atualização do cadastro de uso (CNARH) de todos os usuários com inclusão do número da unidade consumidora de energia elétrica	ANA (PROJECTE)	2017			
3.3	Campanhas de fiscalização	ANA, AESA e IGARN	Contínua			
4	Outras ações					
4.1	Encaminhamento da série histórica de cotas dos reservatórios Curema e Mãe D'Água	DNOCS	Setembro/2017			
4.2	Vistoria técnica aos assentamentos do PIVAS para elaboração de alternativas para atendimento às comunidades rurais usuárias da água do canal da Redenção	Comissão formada na 6ª Reunião Extraordinária do CBH-PPA	Imediato			
4.3	Medição das vazões no canal da Redenção (saída e chegada ao PIVAs - barragem do Pintado)	ANA (PROJECTE)	Imediato (será realizada em conjunto com a ação 4.2)			
4.4	Encaminhamento à COMAR/SRE/ANA do TDR para construção de barramento definitivo na captação para São Bento (PB)	CAGEPA	Imediato			
