


AÇUDE CUREMA


Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

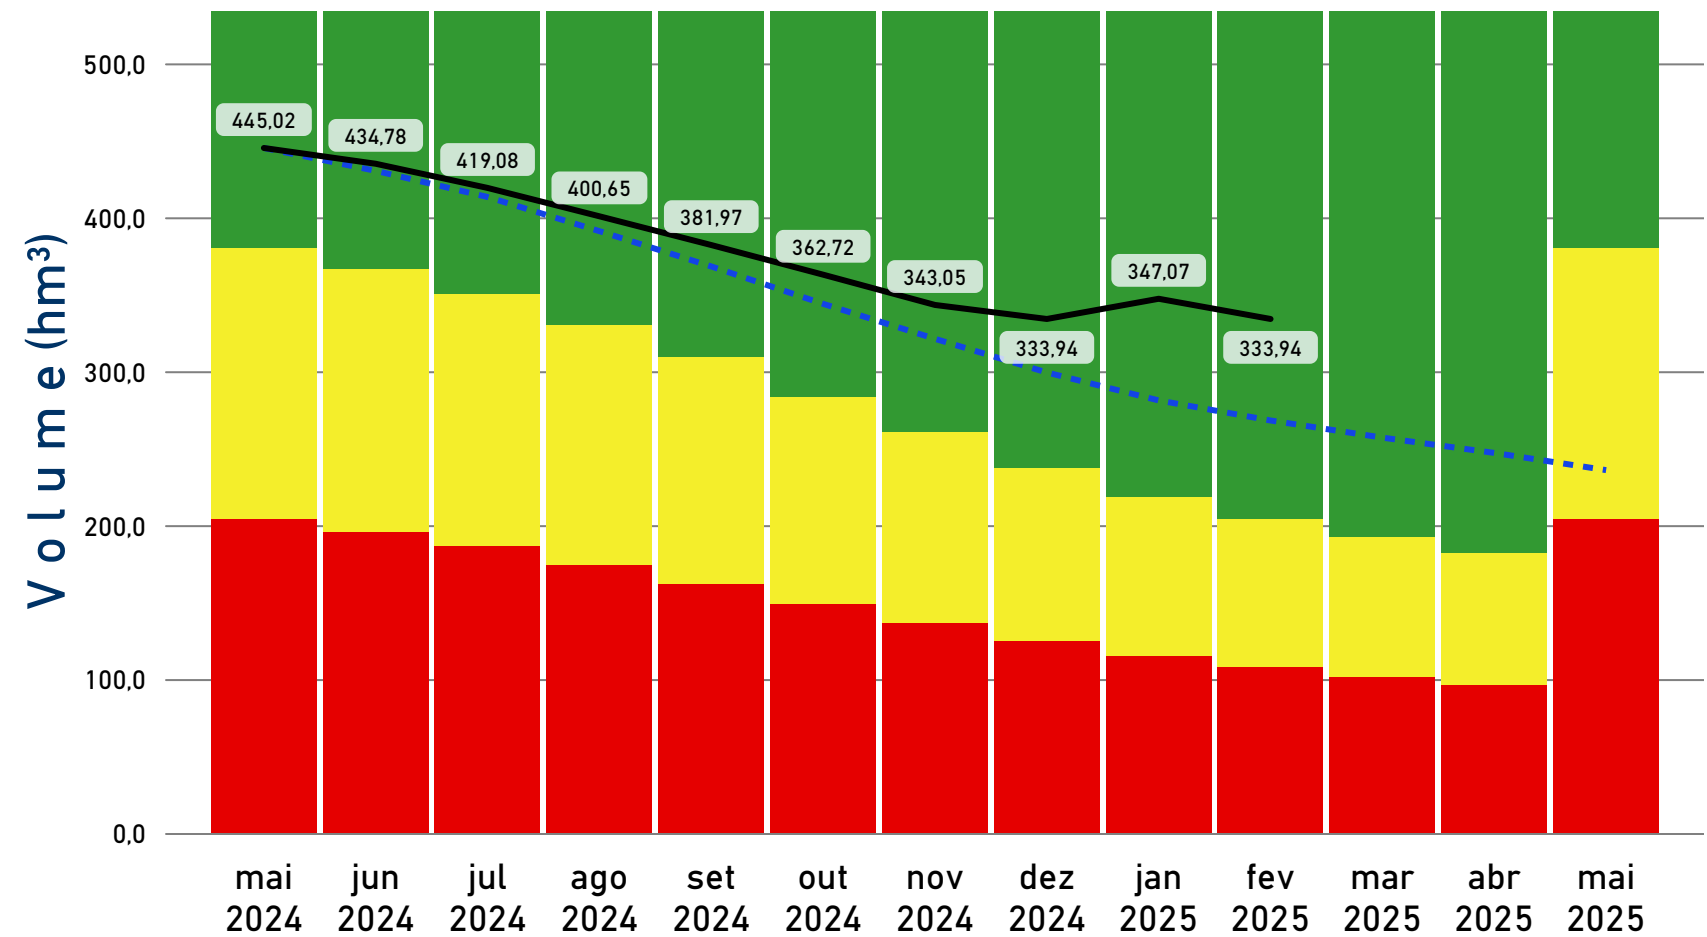

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2024	240,16	445,02	240,16	445,02
jun 2024	239,85	430,18	239,95	434,78
jul 2024	239,49	413,19	239,62	419,08
ago 2024	239,00	391,00	239,22	400,65
set 2024	238,47	368,07	238,80	381,97
out 2024	237,88	343,77	238,35	362,72
nov 2024	237,30	321,05	237,87	343,05
dez 2024	236,70	299,18	237,64	333,94
jan 2025	236,20	281,02	237,97	347,07
fev 2025	235,79	267,99	237,64	333,94
mar 2025	235,44	256,86		
abr 2025	235,10	246,93		
mai 2025	234,74	235,75		

AÇUDE MÃE D'ÁGUA

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

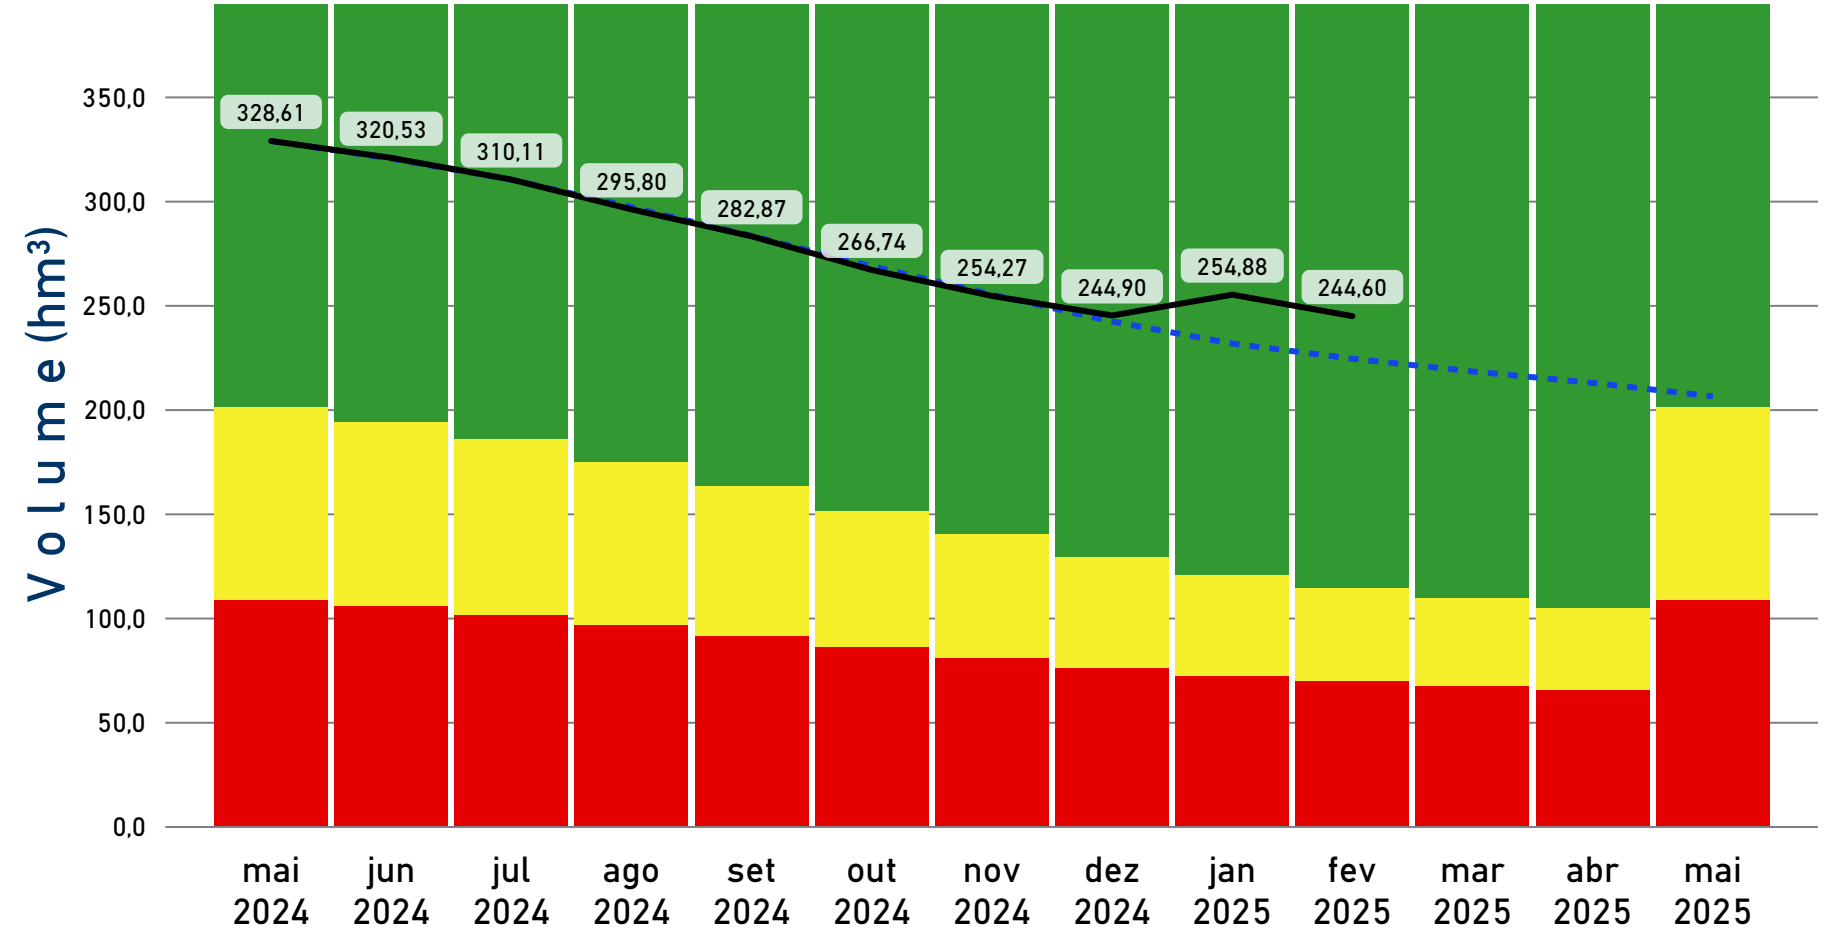

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
mai 2024	240,19	328,61	240,19	328,61
jun 2024	239,95	320,12	239,97	320,53
jul 2024	239,67	310,04	239,68	310,11
ago 2024	239,30	296,87	239,27	295,80
set 2024	238,89	283,08	238,89	282,87
out 2024	238,44	268,51	238,39	266,74
nov 2024	238,01	254,99	237,99	254,27
dez 2024	237,58	242,03	237,68	244,90
jan 2025	237,21	231,44	238,01	254,88
fev 2025	236,96	224,17	237,67	244,60
mar 2025	236,74	218,04		
abr 2025	236,54	212,57		
mai 2025	236,29	206,13		

Fevereiro de
2025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO

2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF

06/06/2024
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Responsavel	Prazo_Frequencia	Status	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA	Diária		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	DNOCS	Diária		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado da Paraíba	CAGEPA	Mensal		
1.4	Medição das vazões captadas para abastecimento público no Estado do Rio Grande do Norte	CAERN	Mensal		
1.5	Medição diária da cota na captação para abastecimento público localizada em Pombal e em São Bento (PB)	CAGEPA	Semanal		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	ANA	Sempre que necessário		
2.2	Calibração do medidor fixo ultrassônico da barragem Curema	DNOCS	Urgente		
2.3	Aferição do medidor fixo ultrassônico da barragem Mãe D'Água para o canal da Redenção	AESA/ANA	01/08/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.
3	OUTRAS AÇOES				
3.1	Instalação de medidores para os usuários no Barrilete Mãe D'água	DNOCS	Urgente		
3.2	Recuperação da casa de proteção do barrilete Mãe D'água	DNOCS	Urgente		
3.3	Vistoria de usuários do barrilete Mãe D'Água e de captações e vazamentos no Canal da Redenção	AESA/ANA	01/08/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.
3.4	Reunião para avaliação do procedimento de solicitação de manobras para ajuste de vazão defluente no reservatório Curema	CAAA/ANA/AESA/CBH/CHESF/DNOCS/SEMARH/IGARN	01/10/2024		Não há informação acerca do cumprimento dessa atividade.

Fevereiro de
2025

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA
SISTEMA HÍDRICO


2024-2025
ALOCAÇÃO

COREMAS
LOCAL

PB
UF



Consumos médios por Finalidades (L/s)

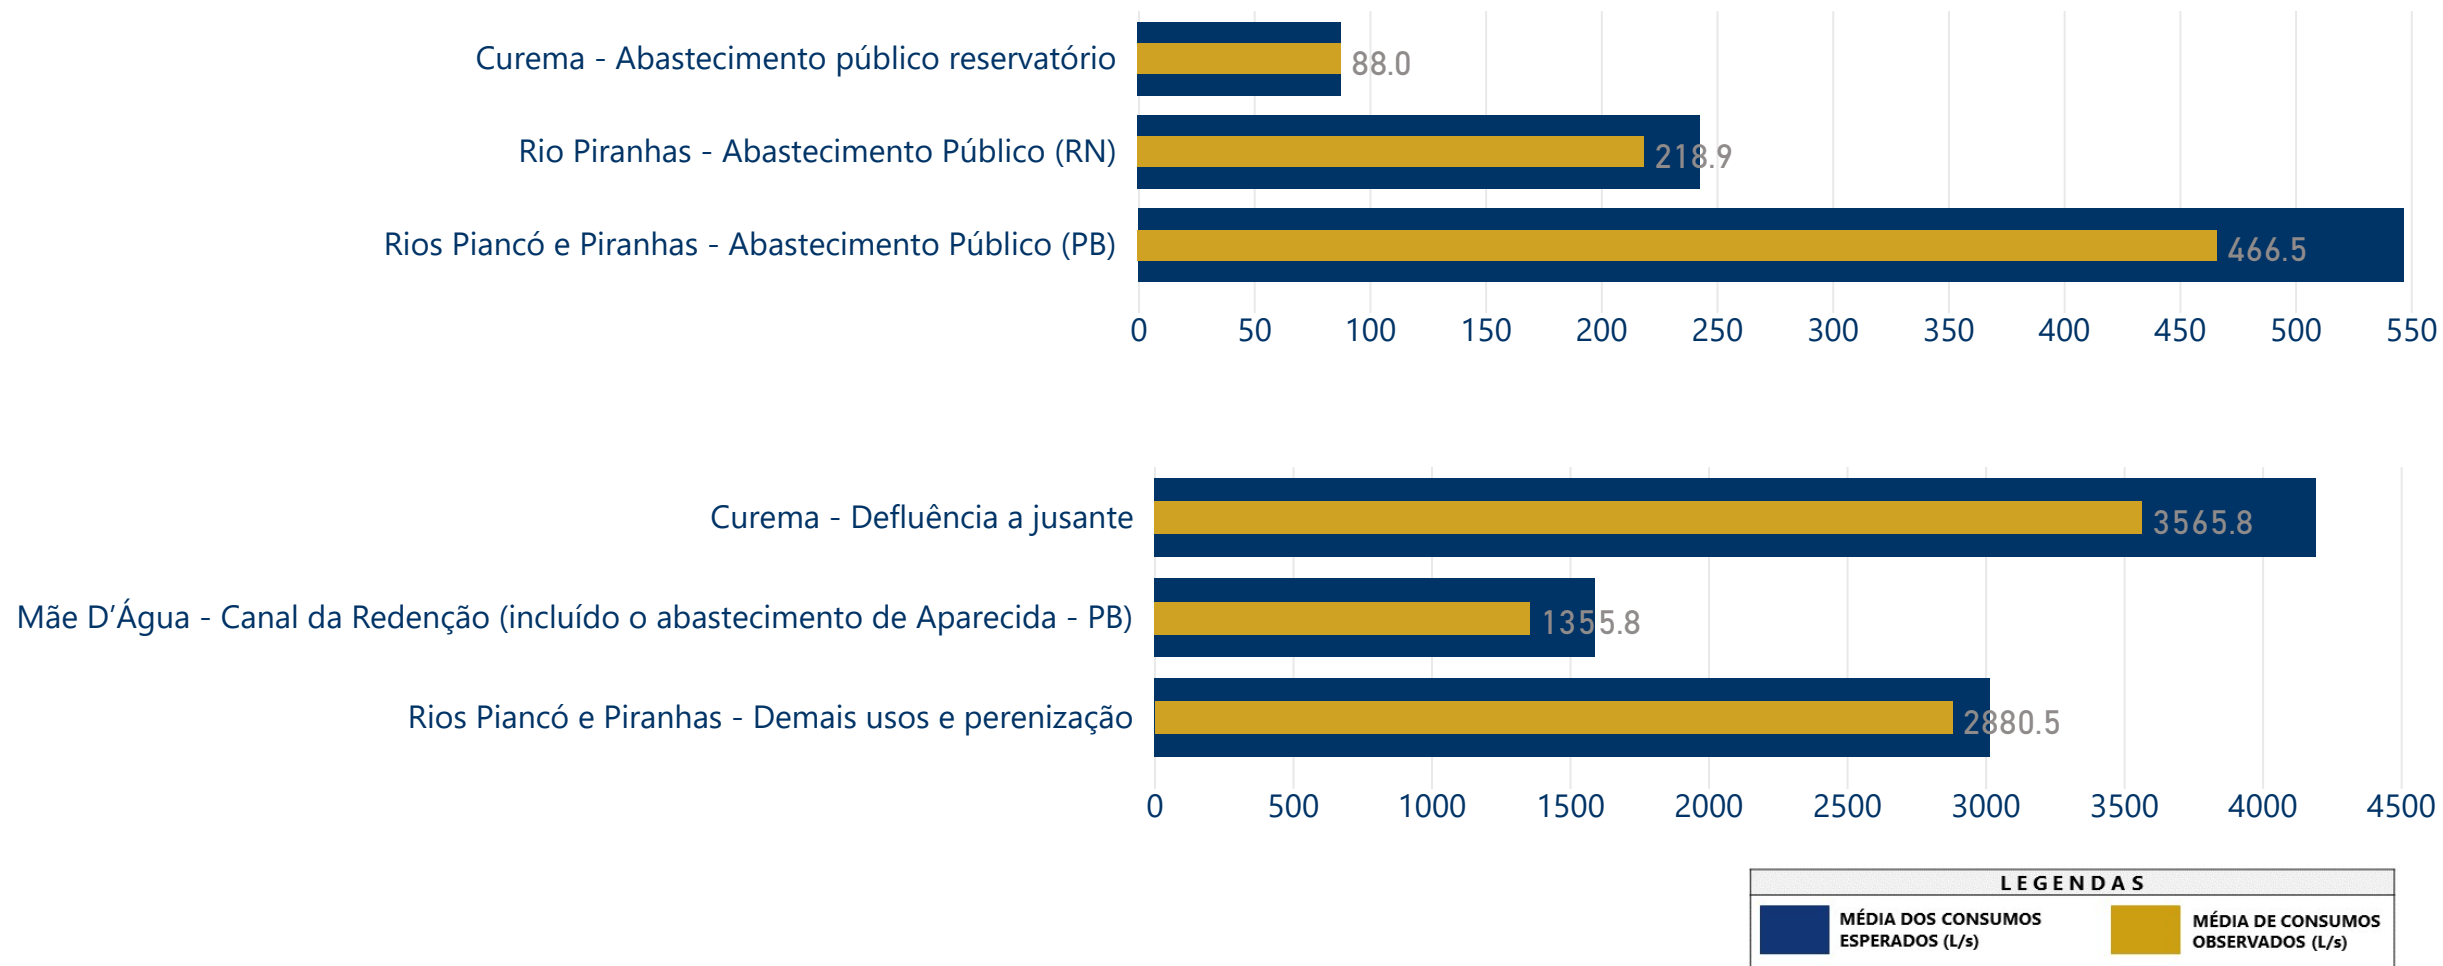

boletim gerado em:

13/03/2025

